


Lösung Schulungsunterlagen

	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Schulungsunterlagen	43 Tage	Mo 21.02.11 08:00	Mi 20.04.11 17:00		
2	Vorbereitende Arbeiten	3,5 Tage	Mo 21.02.11 08:00	Do 24.02.11 12:00		
3	Lieferung der Software	0 Tage	Mo 21.02.11 08:00	Mo 21.02.11 08:00		
4	Programmtest/Einarbeitung	2 Tage	Mo 21.02.11 08:00	Di 22.02.11 17:00	3	Projektleiter;Autoren[200%];Computer[200%]
5	Inhaltsverzeichnis erstellen	1 Tag	Mi 23.02.11 08:00	Mi 23.02.11 17:00	4	Projektleiter
6	Besprechung/Aufteilung	0,5 Tage	Do 24.02.11 08:00	Do 24.02.11 12:00	5	Projektleiter;Autoren[200%]
7	Verfassen der Unterlagen	29 Tage	Do 24.02.11 13:00	Mi 06.04.11 12:00		
8	Unterlagen schreiben	25 Tage	Do 24.02.11 13:00	Do 31.03.11 12:00	6	Autoren[200%];Computer[200%]
9	Unterlagen prüfen	5 Tage	Mo 28.03.11 13:00	Mo 04.04.11 12:00	8EA-3 Tage	Projektleiter;Computer
10	Korrektur einarbeiten	2 Tage	Mo 04.04.11 13:00	Mi 06.04.11 12:00	9	Autoren[200%];Computer[200%]
11	Interner Abschluss (Beta-Test)	0 Tage	Mi 06.04.11 12:00	Mi 06.04.11 12:00	10	
12	Korrektur- und Abschlussarbeiten	9,5 Tage	Do 07.04.11 13:00	Mi 20.04.11 17:00		
13	Externe Korrektur	3 Tage	Do 07.04.11 13:00	Di 12.04.11 12:00	11EA+1 Tag	Korrektor
14	Test- und Schulungseinsatz	3 Tage	Do 07.04.11 13:00	Di 12.04.11 12:00	11EA+1 Tag	Schulungsunternehmen
15	Korrektur einarbeiten	2 Tage	Mi 13.04.11 13:00	Fr 15.04.11 12:00	14EA+1 Tag;13EA+1 Tag	Autoren[200%]
16	Vorbereiten für den Druck	1 Tag	Fr 15.04.11 13:00	Mo 18.04.11 12:00	15	Autoren
17	Durchsicht/Korrektur der Druckvorlage	0,5 Tage	Mi 20.04.11 08:00	Mi 20.04.11 12:00	16EA+1,5 Tage	Projektleiter
18	Druckfreigabe Endversion	0 Tage	Mi 20.04.11 12:00	Mi 20.04.11 12:00	17	Druck
19	Projektauswertung	0,5 Tage	Mi 20.04.11 13:00	Mi 20.04.11 17:00	18	Projektleiter;Autoren[200%]

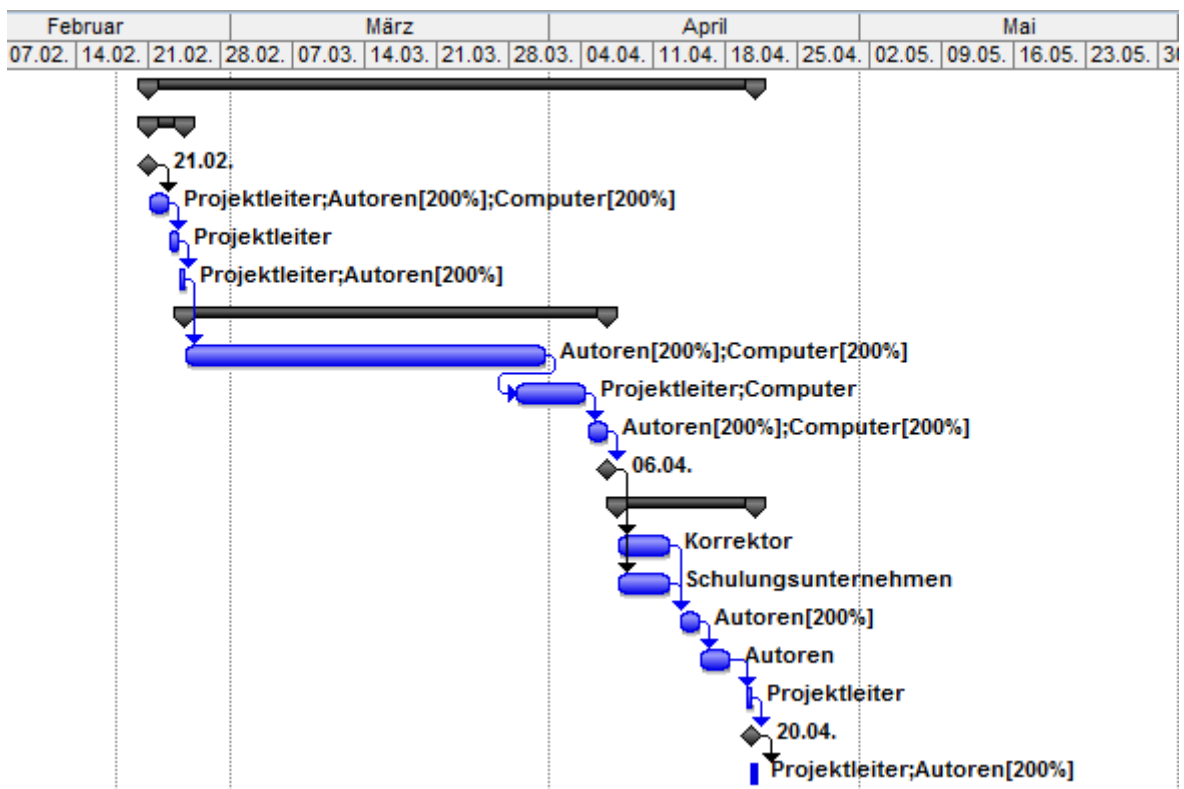

Projektstatistik für "Lösung - Schulungsunterlagen"			
	Anfang		Ende
Berechnet	Mo 21.02.11 08:00		Mi 20.04.11 17:00
Geplant	NV		NV
Aktuell	NV		NV
Abweichung	0t		0t
	Dauer	Arbeit	Kosten
Berechnet	43t	948h	22.020,00 €
Geplant	0t?	0h	0,00 €
Aktuell	0t	0h	0,00 €
Verbleibend	43t	948h	22.020,00 €

Prozent abgeschlossen:

Dauer: 0% Arbeit: 0%

[Schließen](#)
